

ZP.271.26.2018

**Wyjaśnienia i zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 4**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę krytej pływalni
w Nowej Soli.**

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 43 (numeracja pytań prowadzona narastająco)

Wnosimy o uzupełnienie zapisów § 18 ust. 3 wzoru umowy o przesłanki uprawniające do zmiany terminów realizacji w przypadku: wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie zadeklarowanych terminów takich jak: wystąpienie silnych wiatrów, intensywne opady śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur (poniżej 5° C przy pracach związanych z betonowaniem, a przy pozostałych pracach temperatury poniżej -10°C).

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni uwagi wykonawcy i wprowadza możliwość przedłużenia terminu realizacji ze względu na warunki atmosferyczne.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)

W rozdziale II SIWZ § 18 ust. 3 dodaje się lit. g o treści:

„W przypadku zaistnienia sytuacji, w której w trakcie prowadzenia robót budowlanych warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, terminy wykonania ulegną przesunięciu o okres ich występowania. Dotyczy to n/w sytuacji pogodowych:

- wystąpienie deszczu ulewnego rozumianego jako opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 wg skali Chomicza, co wykonawca wykaże zaświadczeniem/stanowiskiem stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniemożliwiające realizację robót, co wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu,
- opady śniegu o przyroście pokrywy śnieżnej powyżej 10 cm w czasie do 24 h co wykonawca wykaże zaświadczeniem/stanowiskiem stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniemożliwiające realizację robót, co wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu,
- występowanie temperatury poniżej – 10 (minus dziesięć) stopni Celsjusza liczonych jako średnia dobowa z trzech wartości pomiarów dokonywanych o 7.00, 13.00 i 18.00, poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych przez właściwego inspektora nadzoru, uniemożliwiające realizację robót, co wykonawca wykaże.”

Pytanie nr 44

Proszę o dołączenie schematów oraz rysunków rozmieszczenie poszczególnych urządzeń automatyki. Projektant w Projekcie wykonawczym powołuje się na rysunki, których nie ma w dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rys schematu ogólnego AKPiA. Lokalizacja elementów AKPiA wynika z schematów i PW instalacji, które AKPiA obsługuje (technologia wody, wentylacja itd.) Projektant nie narzuca sposobu wykonywania połączeń, które będą zależne od przyjętego systemu AKPiA i BMS.

W załączeniu:


1. system AKPiA oraz BMS schemat systemu.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Janek Milewski
WICEPREZYDENT

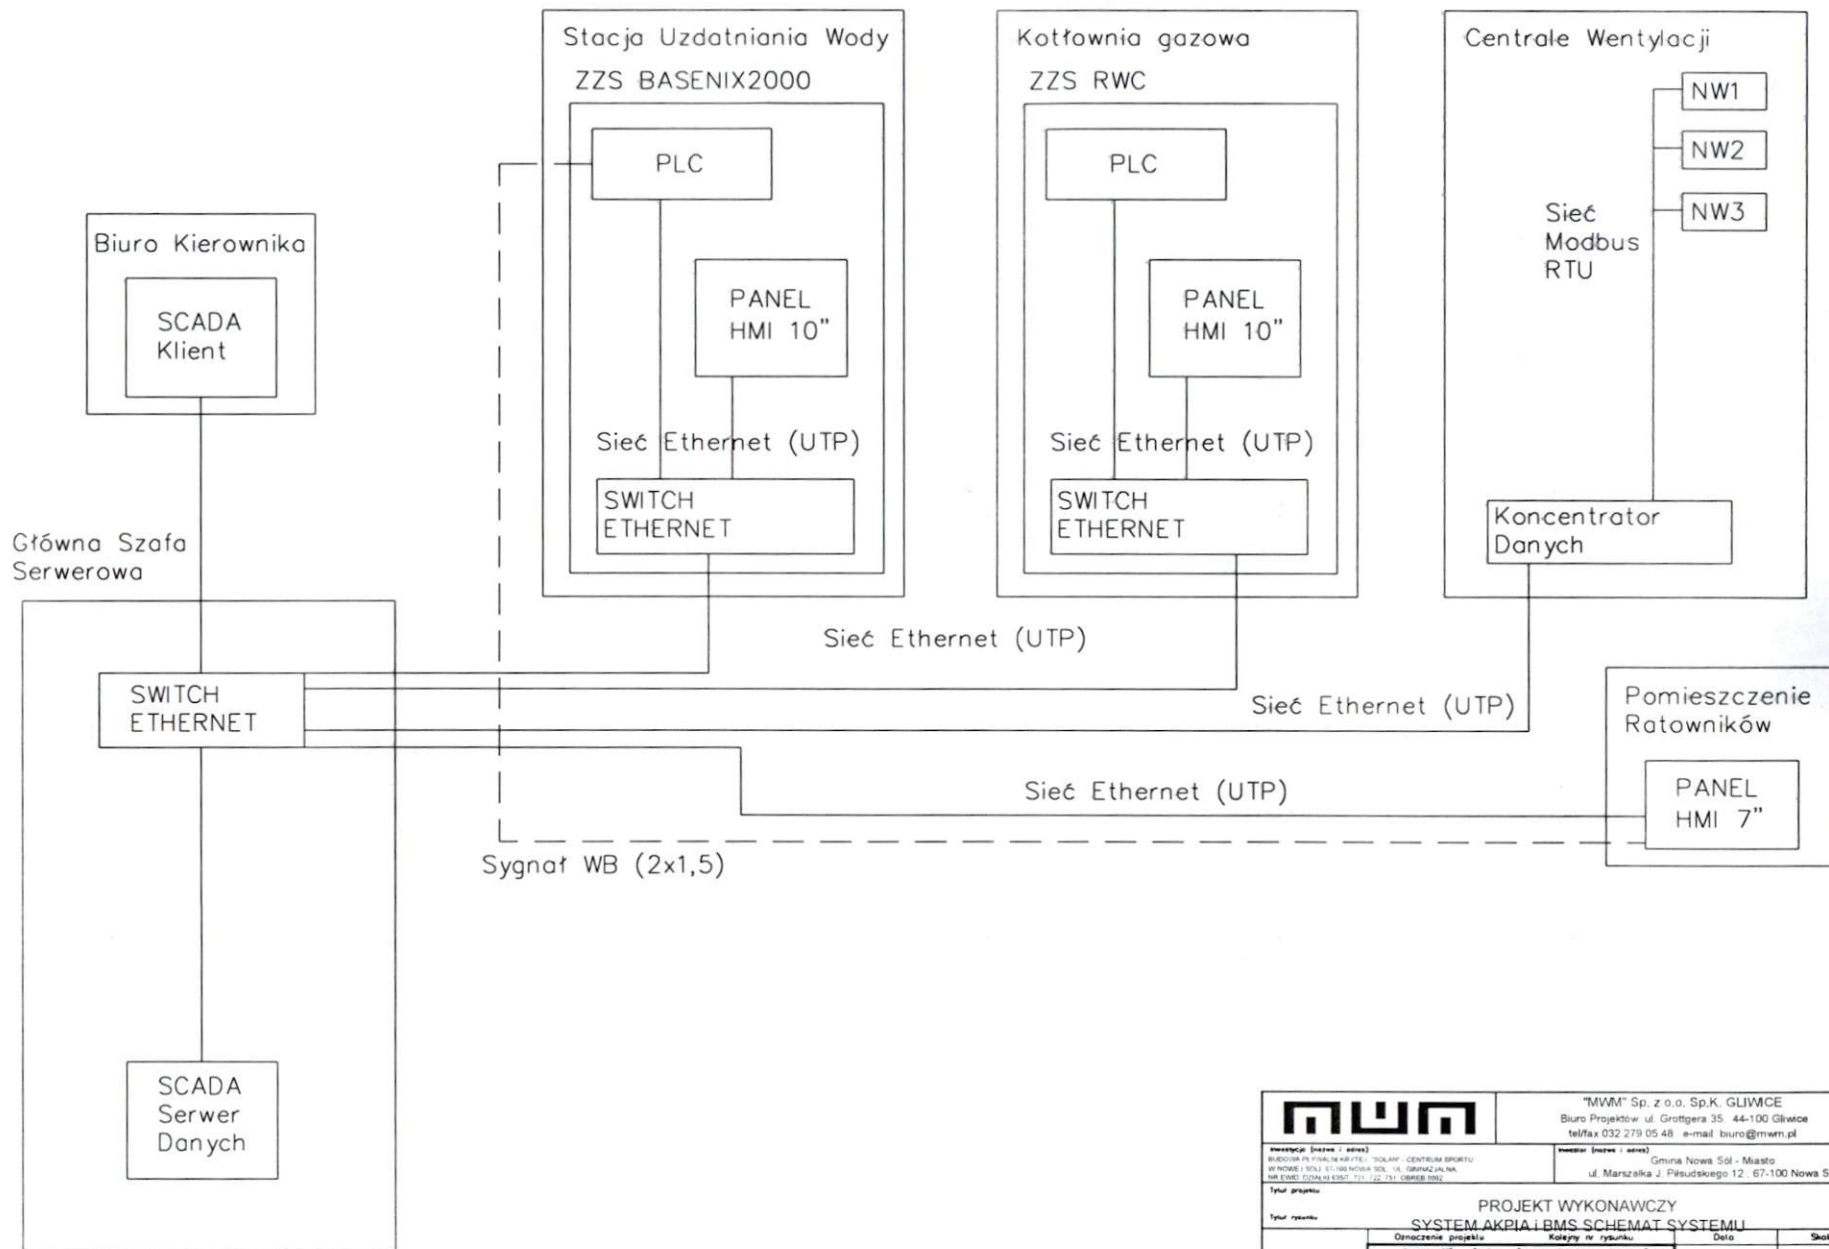

		"MWM" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE Biuro Projektów ul. Grottego 35 44-100 Gliwice tel/fax 032 279 05 48 e-mail biuro@mwm.pl	
		<small> inwestycja (nazwa i adres) BUDOWA PRZEMYSŁOWYCH PŁYD. "SOLARY" - CENTRUM SPORTU W NOWEJ I SOŁY 37-100 NOWA SOŁA UL. GORNAŻALNA NR DOK. DOKUMENTACJI: 710/122-TM-000000-000 </small>	
<small> inwestor (nazwa i adres) Grupa Nowa Sól - Miasto ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól </small>			
Typ projektu:			
PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM AKPIA i BMS SCHEMAT SYSTEMU			
<small>Opiszenie projektu</small>			
<small>nr projektu</small>	<small>Stadium</small>	<small>Brano</small>	<small>Data</small>
KT-225 PW ST 1	1		11.2016
<small>mgr inż. ROBERT WOLTAZSEK</small>			
<small>Autor/Projektant</small>	<small>Opracował</small>	<small>Sprawdził</small>	
